PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar fazalar bo'yicha — ishlar ketma-ketligi, sanalar va pul oqimi

v1.2 · 09.10.2026
Boshlanish 19.10.2026 (taxmin) · tugash 14.12.2026 · Excel: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx, «Fazalar» varag'i

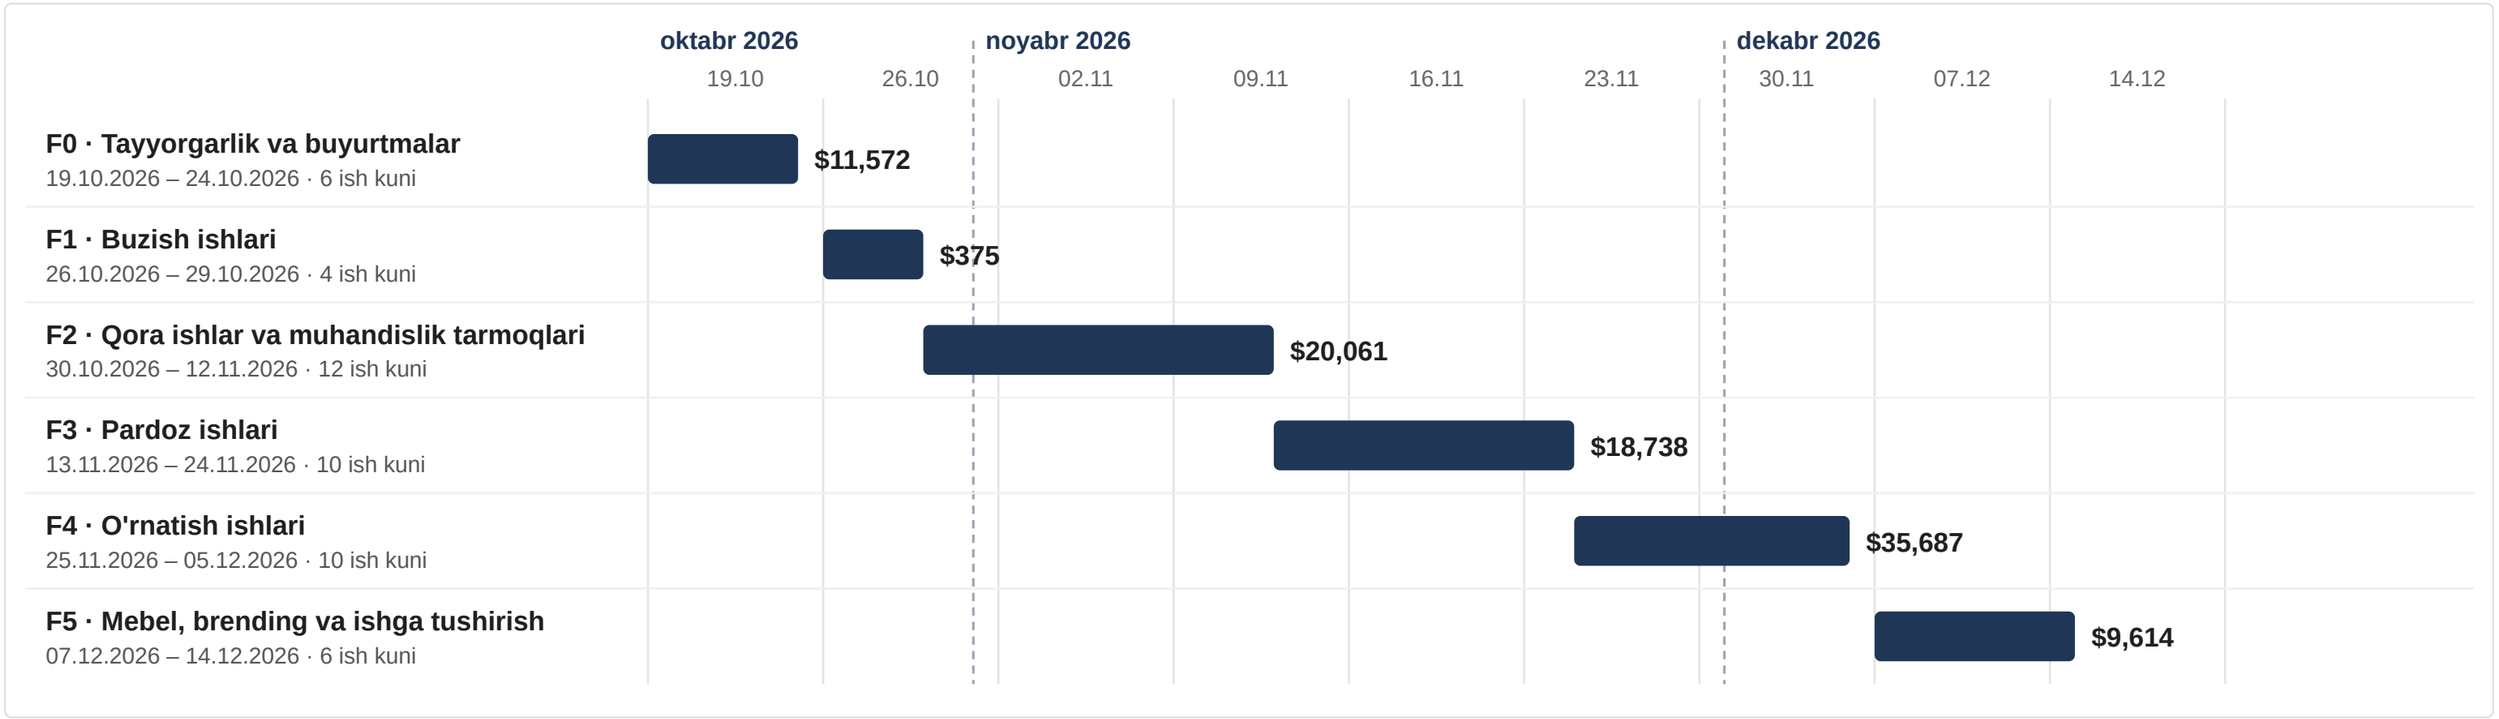

Faza	Nomi va sanalar	Ishlar	Asosiy xarajatlar (shu fazada to'lanadi; 10% siz)	Jami (+10%)	Ulush	Yig'ma
F0	**Tayyorgarlik va buyurtmalar** 19.10.2026 – 24.10.2026 · 6 ish kuni	Ijaraga beruvchining yozma roziligi (devor buzish, tomga tashqi bloklar); joyida o'lchov (oynalar, ustunlar, tom); pudratchilar bilan shartnomalar; uzoq tayyorlanadigan buyurtmalar — kanalli konditsionerlar, mebel va resepshn, logotiplar (avans)	Kanalli konditsionerlar (avans 50%) — **$5,000** Mebel va interyer (avans 50%) — **$2,895** Logotip (avans 50%) — **$1,625** Resepshn (1-qavat) (avans 50%) — **$1,000**	**$11,572** 137.7 mln so'm	12%	$11,572
F1	**Buzish ishlari** 26.10.2026 – 29.10.2026 · 4 ish kuni	Eski devorlarni buzish, qurilish chiqindisini olib chiqish; pol, oyna va eshiklarni himoyalash	Buzish ishlari — **$341**	**$375** 4.5 mln so'm	0%	$11,947
F2	**Qora ishlar va muhandislik tarmoqlari** 30.10.2026 – 12.11.2026 · 12 ish kuni	GKL karkaslar va birinchi tomoni; elektr (yoritish, konditsioner liniyalari, kamera va yong'in signalizatsiyasi kabellari); santexnika quvurlari va nuqtalari; kanalli konditsionerlar (kladovka shifti ustida), vitechka ventilyatori, havo kanallari, freon trassalari va drenaj — shift yopilishidan oldin; tashqi blok tayanch ramalari	Kanalli konditsionerlar (qoldiq 50%) — **$5,000** Havo kanallari — **$4,513** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$2,039** Elektr — **$1,461** Internet va Wi-Fi — **$1,138** Diffuzor, panjaralar, ventilyator — **$900** va boshqalar (7)	**$20,061** 238.7 mln so'm	21%	$32,007
F3	**Pardoz ishlari** 13.11.2026 – 24.11.2026 · 10 ish kuni	GKL ikkinchi tomoni, shpaklyovka, bo'yoq; hojatxona kafeli; bambuk panellar; sahna poli; shisha devorlar o'lchovi va buyurtmasi (avans)	Bambuk panel — **$8,292** Shisha devor (avans 50%) — **$3,860** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$2,039** Kafel — **$1,244** Konditsioner (3-qavat) — **$1,000** Koworking sahnasi (ishning 50%) — **$350** va boshqalar (1)	**$18,738** 223 mln so'm	20%	$50,746
F4	**O'rnatish ishlari** 25.11.2026 – 05.12.2026 · 10 ish kuni	Shisha devor va suriladigan eshiklar, kladovka eshiklari, perila, yoritish, diffuzor va panjaralar, santexnika jihozlari va kabinalar, kameralar va NVR, yong'in signalizatsiyasi asboblari, interaktiv doskalar, matli plyonka, sahna yoritishi va ekran	Interaktiv doska — **$8,256** Shisha devor (qoldiq 50%) — **$3,860** Yoritish — **$3,024** Kamera tizimi — **$2,984** Eshiklar — **$2,350** Perila — **$2,323** va boshqalar (11)	**$35,687** 424.7 mln so'm	37%	$86,432
F5	**Mebel, brending va ishga tushirish** 07.12.2026 – 14.12.2026 · 6 ish kuni	Mebel va resepshn (qoldiq), logotiplar, e'lon va e'tirof doskalari, sahna reykalari, ovoz, minbar; HVAC sozlash va sinov, yong'in xavfsizligi qabuli, tozalash	Mebel va interyer (qoldiq 50%) — **$2,895** Logotip (qoldiq 50%) — **$1,625** Mebel va interyer — **$1,500** Koworking sahnasi — **$1,350** Resepshn (1-qavat) (qoldiq 50%) — **$1,000** E'lon va e'tirof doskalari — **$370**	**$9,614** 114.4 mln so'm	10%	$96,046
	JAMI	**48 ish kuni (~8 hafta)**	**xarajatlar $87,315 + kutilmagan 10% $8,731**	**$96,046** **1,143 mln so'm**	**100%**	

Oy	To'lov, $	so'm
oktabr 2026	**$14,812**	176.3 mln so'm
noyabr 2026	**$55,399**	659.2 mln so'm
dekabr 2026	**$25,835**	307.4 mln so'm
Jami	**$96,046**	**1,143 mln so'm**

Qanday bo'lingan. Har bir xarajat qatori ish qachon bajarilsa yoki pul qachon to'lansa — o'sha fazaga yozilgan. Uzoq tayyorlanadiganlarga avans: mebel, resepshn va logotiplar — 50% F0 da, qoldig'i yetkazilganda (F5); kanalli konditsionerlar — 50% F0 da, 50% F2 da (shift yopilishidan oldin o'rnatiladi); shisha devorlar — o'lchovdan keyin 50% (F3), qoldig'i o'rnatishda (F4). Diffuzor, panjaralar va eshik mexanizmlari — F4.

Ketma-ketlik nega shunday: tarmoqlar (konditsioner bloklari, havo kanallari, freon trassalari, kabellar, quvurlar) shift va devorlar yopilishidan oldin — F2; shisha devor o'lchovi GKL karkasdan keyin; mebel va logotiplar — chang ishlar tugagach.

Oylik summa — faza summasi uning kalendar kunlariga teng bo'lingan; avanslar faza boshida to'lanadi.

Sanalar taxminiy: boshlanish sanasi Excelda bitta katakda — o'zgartirilsa, hammasi qayta hisoblanadi. Ish haftasi dushanba–shanba, 8 dekabr bayram.

Jadvalda yo'q (narxi berilmagan): montaj ishlari (agar narxga kirmagan bo'lsa), elektr kabellari va shit, osma shift, pol, bo'yoq — narxi kelishilgach shu fazalarga qo'shiladi.
