
PDP Academy · Xadra filiali

# Xarajatlar fazalar bo'yicha — ishlar ketma-ketligi, sanalar va pul oqimi

v1.2 · 09.10.2026
Boshlanish 19.10.2026 (taxmin) · tugash 14.12.2026 · Excel: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx, «Fazalar» varag'i

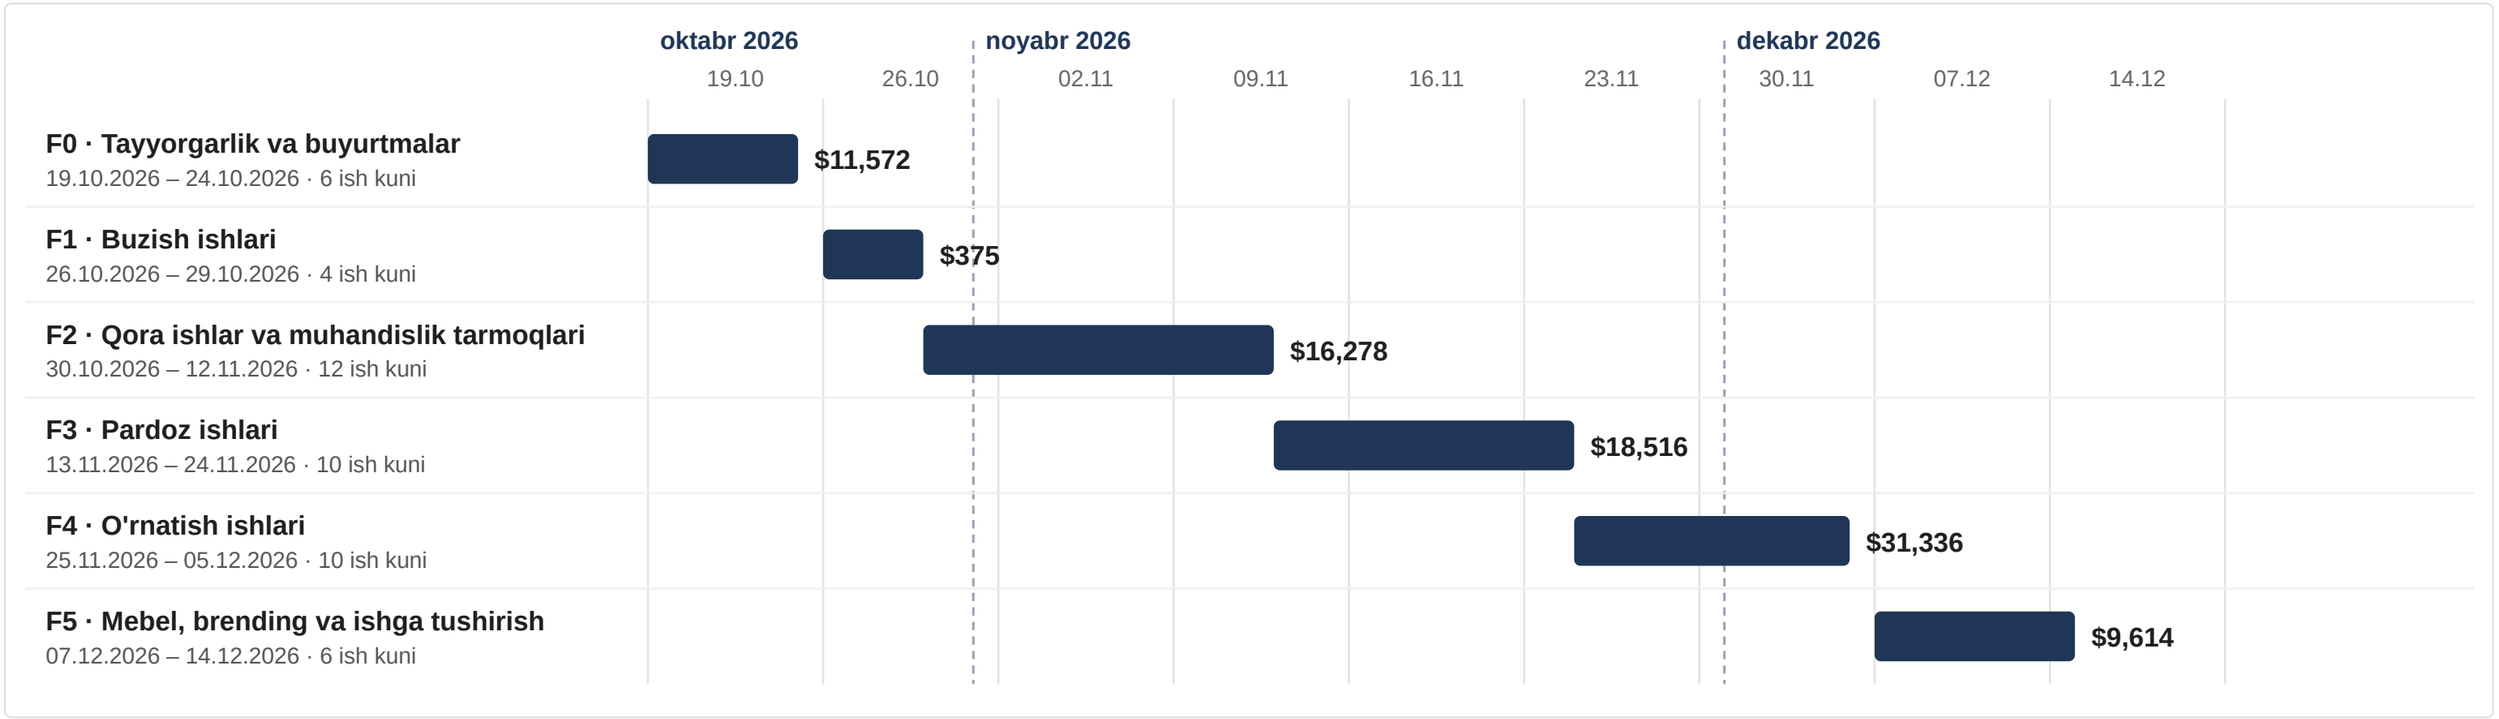


| Faza | Nomi va sanalar | Ishlar | Asosiy xarajatlar (shu fazada to'lanadi; 10% siz) | Jami (+10%) | Ulush | Yig'ma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | **Tayyorgarlik va buyurtmalar**<br>19.10.2026 – 24.10.2026 · 6 ish kuni | Ijaraga beruvchining yozma roziligi (devor buzish, tomga tashqi bloklar); joyida o'lchov (oynalar, ustunlar, tom); pudratchilar bilan shartnomalar; uzoq tayyorlanadigan buyurtmalar — kanalli konditsionerlar, mebel va resepshn, logotiplar (avans) | Kanalli konditsionerlar (avans 50%) — **$5,000**<br>Mebel va interyer (avans 50%) — **$2,895**<br>Logotip (avans 50%) — **$1,625**<br>Resepshn (1-qavat) (avans 50%) — **$1,000** | **$11,572**<br>137.7 mln so'm | 13% | $11,572 |
| F1 | **Buzish ishlari**<br>26.10.2026 – 29.10.2026 · 4 ish kuni | Eski devorlarni buzish, qurilish chiqindisini olib chiqish; pol, oyna va eshiklarni himoyalash | Buzish ishlari — **$341** | **$375**<br>4.5 mln so'm | 0% | $11,947 |
| F2 | **Qora ishlar va muhandislik tarmoqlari**<br>30.10.2026 – 12.11.2026 · 12 ish kuni | GKL karkaslar va birinchi tomoni; elektr (yoritish, konditsioner liniyalari, kamera va yong'in signalizatsiyasi kabellari); santexnika quvurlari va nuqtalari; kanalli konditsionerlar (kladovka shifti ustida), vitechka ventilyatori, havo kanallari, freon trassalari va drenaj — shift yopilishidan oldin; tashqi blok tayanch ramalari | Kanalli konditsionerlar (qoldiq 50%) — **$5,000**<br>Havo kanallari — **$4,639**<br>Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$1,826**<br>Diffuzor, panjaralar, ventilyator — **$900**<br>Santexnika (ishning 50%) — **$672**<br>Yong'in xavfsizligi (ishning 40%) — **$605**<br>va boshqalar (3) | **$16,278**<br>193.7 mln so'm | 19% | $28,224 |
| F3 | **Pardoz ishlari**<br>13.11.2026 – 24.11.2026 · 10 ish kuni | GKL ikkinchi tomoni, shpaklyovka, bo'yoq; hojatxona kafeli; bambuk panellar; sahna poli; shisha devorlar o'lchovi va buyurtmasi (avans) | Bambuk panel — **$8,292**<br>Shisha devor (avans 50%) — **$3,871**<br>Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$1,826**<br>Kafel — **$1,244**<br>Konditsioner (3-qavat) — **$1,000**<br>Koworking sahnasi (ishning 50%) — **$350**<br>va boshqalar (1) | **$18,516**<br>220.3 mln so'm | 21% | $46,740 |
| F4 | **O'rnatish ishlari**<br>25.11.2026 – 05.12.2026 · 10 ish kuni | Shisha devor va suriladigan eshiklar, kladovka eshiklari, perila, yoritish, diffuzor va panjaralar, santexnika jihozlari va kabinalar, kameralar va NVR, yong'in signalizatsiyasi asboblari, interaktiv doskalar, matli plyonka, sahna yoritishi va ekran | Interaktiv doska — **$8,256**<br>Shisha devor (qoldiq 50%) — **$3,871**<br>Yoritish — **$3,024**<br>Eshiklar — **$2,350**<br>Perila — **$2,323**<br>Kamera tizimi — **$1,816**<br>va boshqalar (7) | **$31,336**<br>372.9 mln so'm | 36% | $78,077 |
| F5 | **Mebel, brending va ishga tushirish**<br>07.12.2026 – 14.12.2026 · 6 ish kuni | Mebel va resepshn (qoldiq), logotiplar, e'lon va e'tirof doskalari, sahna reykalari, ovoz, minbar; HVAC sozlash va sinov, yong'in xavfsizligi qabuli, tozalash | Mebel va interyer (qoldiq 50%) — **$2,895**<br>Logotip (qoldiq 50%) — **$1,625**<br>Mebel va interyer — **$1,500**<br>Koworking sahnasi — **$1,350**<br>Resepshn (1-qavat) (qoldiq 50%) — **$1,000**<br>E'lon va e'tirof doskalari — **$370** | **$9,614**<br>114.4 mln so'm | 11% | $87,691 |
| | **JAMI** | **48 ish kuni (~8 hafta)** | **xarajatlar $79,719 + kutilmagan 10% $7,972** | **$87,691**<br>**1,043.5 mln so'm** | **100%** | |

| Oy | To'lov, $ | so'm |
|---|---|---|
| oktabr 2026 | **$14,272** | 169.8 mln so'm |
| noyabr 2026 | **$49,561** | 589.8 mln so'm |
| dekabr 2026 | **$23,858** | 283.9 mln so'm |
| **Jami** | **$87,691** | **1,043.5 mln so'm** |

**Qanday bo'lingan.** Har bir xarajat qatori ish qachon bajarilsa yoki pul qachon to'lansa — o'sha fazaga yozilgan. Uzoq tayyorlanadiganlarga avans: mebel, resepshn va logotiplar — 50% F0 da, qoldig'i yetkazilganda (F5); kanalli konditsionerlar — 50% F0 da, 50% F2 da (shift yopilishidan oldin o'rnatiladi); shisha devorlar — o'lchovdan keyin 50% (F3), qoldig'i o'rnatishda (F4). Diffuzor, panjaralar va eshik mexanizmlari — F4.

**Ketma-ketlik nega shunday:** tarmoqlar (konditsioner bloklari, havo kanallari, freon trassalari, kabellar, quvurlar) shift va devorlar yopilishidan oldin — F2; shisha devor o'lchovi GKL karkasdan keyin; mebel va logotiplar — chang ishlar tugagach.

**Oylik summa** — faza summasi uning kalendar kunlariga teng bo'lingan; avanslar faza boshida to'lanadi.

**Sanalar taxminiy:** boshlanish sanasi Excelda bitta katakda — o'zgartirilsa, hammasi qayta hisoblanadi. Ish haftasi dushanba–shanba, 8 dekabr bayram.

**Jadvalda yo'q** (narxi berilmagan): montaj ishlari (agar narxga kirmagan bo'lsa), elektr kabellari va shit, osma shift, pol, bo'yoq — narxi kelishilgach shu fazalarga qo'shiladi.
