
PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar fazalar bo'yicha — ishlar ketma-ketligi, sanalar va pul oqimi

v1.2 · 09.10.2026
Boshlanish 19.10.2026 (taxmin) · tugash 14.12.2026 · Excel: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx, «Fazalar» varag'i

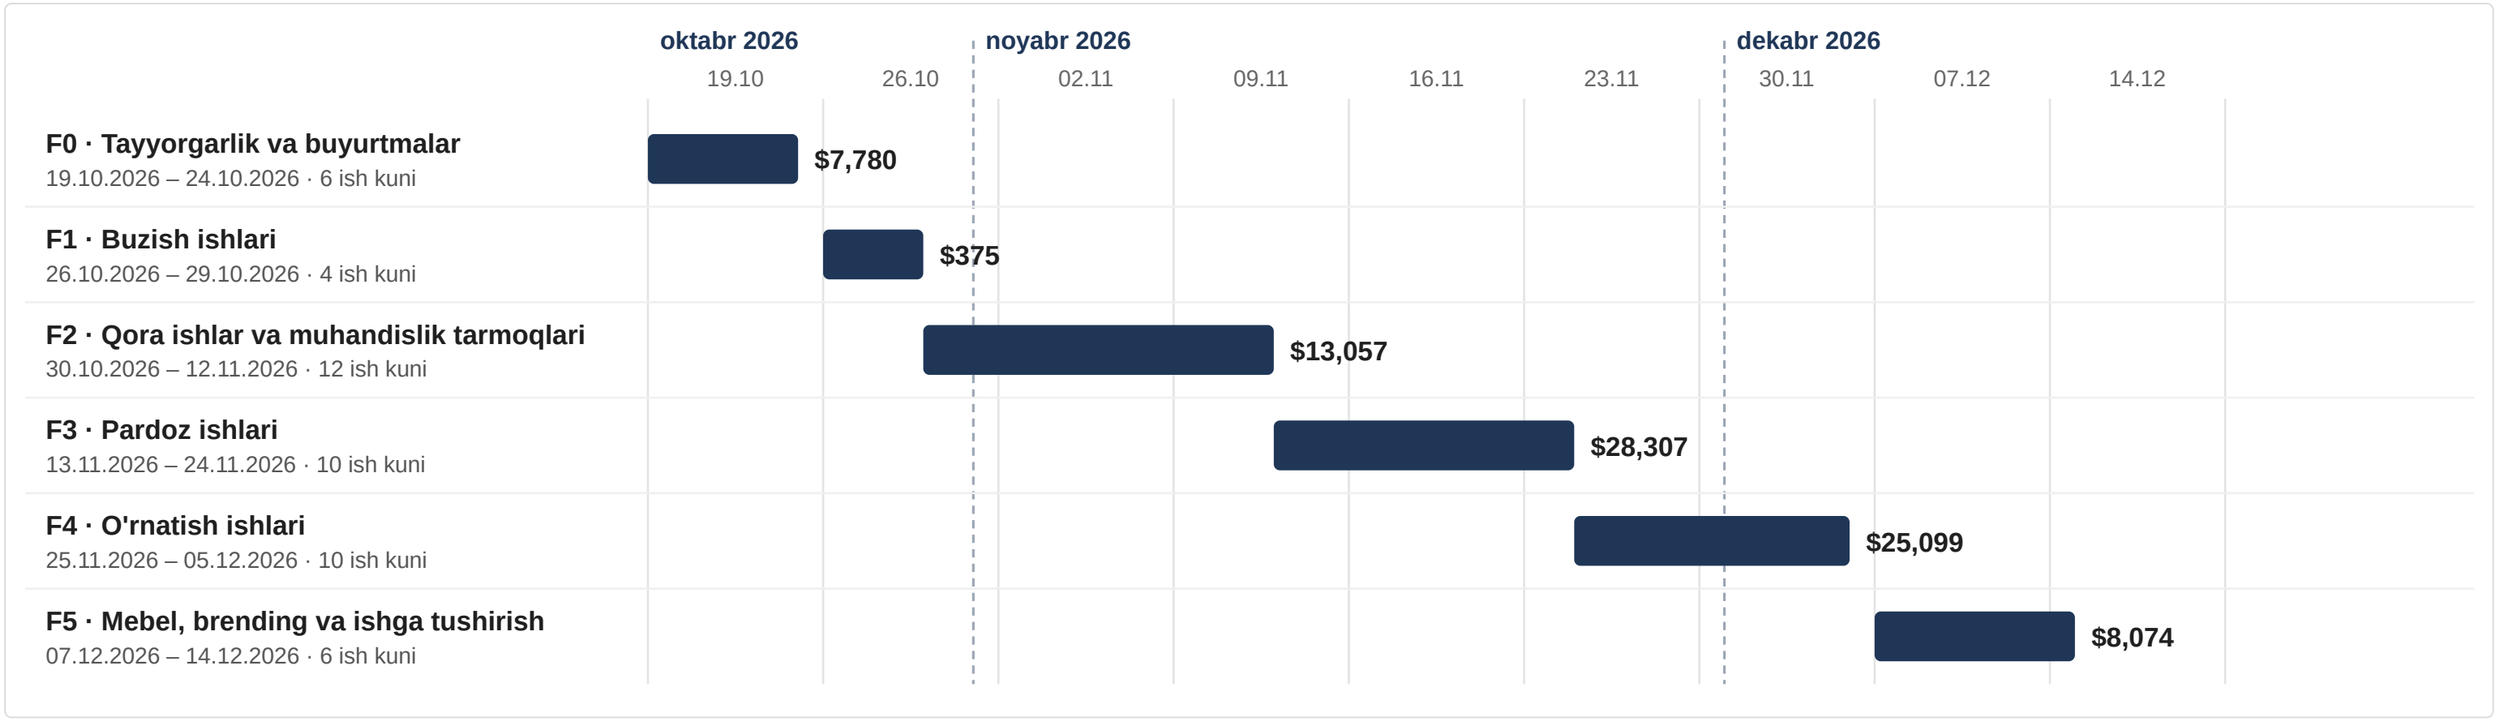

Faza	Nomi va sanalar	Ishlar	Asosiy xarajatlar (shu fazada to'lanadi; 10% siz)	Jami (+10%)	Ulush	Yig'ma
F0	**Tayyorgarlik va buyurtmalar** 19.10.2026 – 24.10.2026 · 6 ish kuni	Ijaraga beruvchining yozma roziligi (devor buzish, tomga tashqi bloklar); joyida o'lchov (oynalar, ustunlar, tom); pudratchilar bilan shartnomalar; uzoq tayyorlanadigan buyurtmalar — rekuperatorlar, mebel va resepshn, logotiplar (avans)	Rekuperatorlar (avans 50%) — **$2,353** Mebel va interyer (avans 50%) — **$2,095** Logotip (avans 50%) — **$1,625** Resepshn (1-qavat) (avans 50%) — **$1,000**	**$7,780** 92.6 mln so'm	9%	$7,780
F1	**Buzish ishlari** 26.10.2026 – 29.10.2026 · 4 ish kuni	Eski devorlarni buzish, qurilish chiqindisini olib chiqish; pol, oyna va eshiklarni himoyalash	Buzish ishlari — **$341**	**$375** 4.5 mln so'm	0%	$8,155
F2	**Qora ishlar va muhandislik tarmoqlari** 30.10.2026 – 12.11.2026 · 12 ish kuni	GKL karkaslar va birinchi tomoni; elektr (yoritish, split liniyalari, kamera va yong'in signalizatsiyasi kabellari); santexnika quvurlari va nuqtalari; rekuperatorlar, havo kanallari, freon trassalari va drenaj — shift yopilishidan oldin; tomdagi tayanch ramalar	Havo kanallari — **$5,319** Rekuperatorlar (qoldiq 50%) — **$2,353** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$1,765** Santexnika (ishning 50%) — **$672** Yong'in xavfsizligi (ishning 40%) — **$605** Santexnika — **$503** va boshqalar (2)	**$13,057** 155.4 mln so'm	16%	$21,212
F3	**Pardoz ishlari** 13.11.2026 – 24.11.2026 · 10 ish kuni	GKL ikkinchi tomoni, shpaklyovka, bo'yoq; hojatxona kafeli; bambuk panellar; sahna poli; shisha devorlar o'lchovi va buyurtmasi (avans); splitlar xaridi	Split konditsionerlar — **$10,360** Bambuk panel — **$8,466** Shisha devor (avans 50%) — **$3,300** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$1,765** Kafel — **$1,244** Koworking sahnasi (ishning 50%) — **$350** va boshqalar (1)	**$28,307** 336.9 mln so'm	34%	$49,519
F4	**O'rnatish ishlari** 25.11.2026 – 05.12.2026 · 10 ish kuni	Shisha devor va eshiklar, perila, yoritish, split ichki va tomdagi tashqi bloklari, santexnika jihozlari va kabinalar, kameralar va NVR, yong'in signalizatsiyasi asboblari, interaktiv doskalar, matli plyonka, sahna yoritishi va ekran	Interaktiv doska — **$8,256** Shisha devor (qoldiq 50%) — **$3,300** Yoritish — **$3,024** Perila — **$2,323** Kamera tizimi — **$1,816** Santexnika — **$1,471** va boshqalar (4)	**$25,099** 298.7 mln so'm	30%	$74,617
F5	**Mebel, brending va ishga tushirish** 07.12.2026 – 14.12.2026 · 6 ish kuni	Mebel va resepshn (qoldiq), logotiplar, e'lon va e'tirof doskalari, sahna reykalari, ovoz, minbar; HVAC sozlash va sinov, yong'in xavfsizligi qabuli, tozalash	Mebel va interyer (qoldiq 50%) — **$2,095** Logotip (qoldiq 50%) — **$1,625** Koworking sahnasi — **$1,350** Resepshn (1-qavat) (qoldiq 50%) — **$1,000** Mebel va interyer — **$900** E'lon va e'tirof doskalari — **$370**	**$8,074** 96.1 mln so'm	10%	$82,691
	JAMI	**48 ish kuni (~8 hafta)**	**xarajatlar $75,174 + kutilmagan 10% $7,517**	**$82,691** **984 mln so'm**	**100%**	

Oy	To'lov, $	so'm
oktabr 2026	**$10,020**	119.2 mln so'm
noyabr 2026	**$53,189**	632.9 mln so'm
dekabr 2026	**$19,482**	231.8 mln so'm
Jami	**$82,691**	**984 mln so'm**

Qanday bo'lingan. Har bir xarajat qatori ish qachon bajarilsa yoki pul qachon to'lansa — o'sha fazaga yozilgan. Uzoq tayyorlanadiganlarga avans: mebel, resepshn va logotiplar — 50% F0 da, qoldig'i yetkazilganda (F5); rekuperatorlar — 50% F0 da, 50% F2 da; shisha devorlar — o'lchovdan keyin 50% (F3), qoldig'i o'rnatishda (F4). Splitlar F3 da xarid qilinadi, F4 da o'rnatiladi.

Ketma-ketlik nega shunday: tarmoqlar (havo kanallari, freon trassalari, kabellar, quvurlar) shift va devorlar yopilishidan oldin — F2; shisha devor o'lchovi GKL karkasdan keyin; mebel va logotiplar — chang ishlar tugagach.

Oylik summa — faza summasi uning kalendar kunlariga teng bo'lingan; avanslar faza boshida to'lanadi.

Sanalar taxminiy: boshlanish sanasi Excelda bitta katakda — o'zgartirilsa, hammasi qayta hisoblanadi. Ish haftasi dushanba–shanba, 8 dekabr bayram.

Jadvalda yo'q (narxi berilmagan): montaj ishlari (agar narxga kirmagan bo'lsa), elektr kabellari va shit, osma shift, pol, bo'yoq — narxi kelishilgach shu fazalarga qo'shiladi.
